




ORIENTACIONES EN LA DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES – S/SI AEI

1. Fases

1. Definición
- 2. Planificación**
3. Ejecución (Seguimiento y Control)
4. Acreditación

CICLO DE VIDA DEL SUBPROYECTO

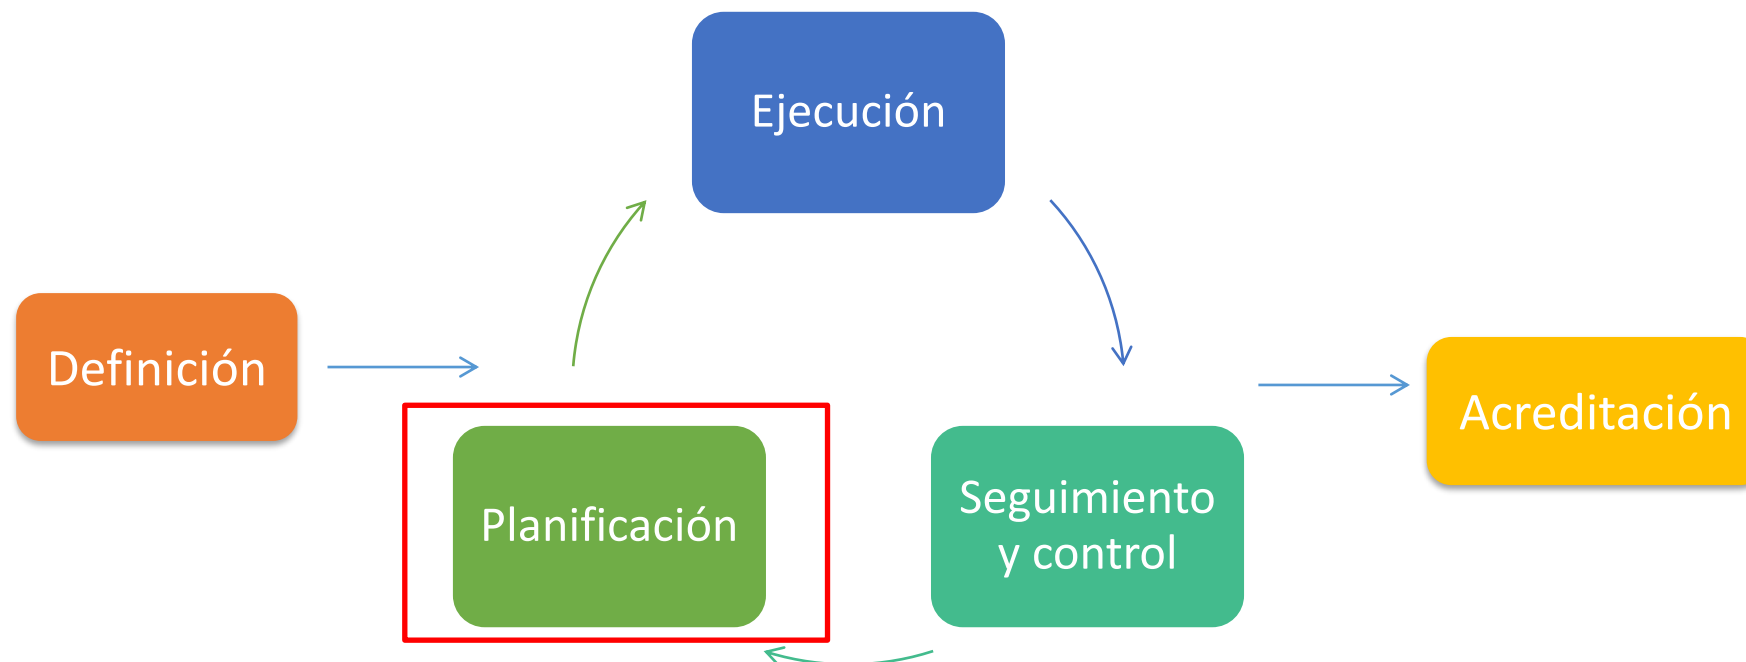

Se aplica en todos los niveles del Plan de forma jerárquica



FASE DE PLANIFICACIÓN

El objetivo de esta fase es que las Actuaciones lleguen a estado "Revisado"

1. Creación de los Hitos Auxiliares de Planificación **¿LO NECESITO EN MI ACTUACIÓN?**

2. Creación de las Actuaciones.

3. Edición de las Actuaciones – Datos Generales.

4. Edición de las Actuaciones – Recursos Económicos.

5. Edición de las Actuaciones – Hitos y Objetivos.

6. Ciclo de Validación de la Planificación.



FASE DE PLANIFICACIÓN



FASE DE PLANIFICACIÓN

¿QUÉ ELEMENTOS CONDICIONAN LA CREACIÓN DE ACTUACIONES?

1. Los destinatarios de la actuación **solo podrán tener una naturaleza: públicos o privados**. No podrán existir dentro de una actuación destinatarios de ambos tipos.
2. Si el proyecto o subproyecto tienen varias submedidas, y, en consecuencia, varios campos de intervención, solo podrá seleccionarse uno por actuación (no aplica al caso de MCINN, puesto que no se da esta circunstancia en ninguna medida).
3. **Las actuaciones pueden tener un instrumento jurídico asociado o varios**, pero en este último caso, **solo podrán incluirse varios si son de la misma clase** (i.e. solo subvenciones; solo contratos...). CLASES DE ACTUACIONES. **¿QUÉ ACTUACIONES TENDRÉ COMO GESTOR DE SUBPROYECTO EN C17?**
4. **Todos los instrumentos jurídicos que se incluyan en una actuación** (si se incluyen varios) **deben contribuir a los mismos H/O CID**, y en consecuencia, **a los mismos indicadores**.

Adicionalmente, conviene tener presente que:

Siempre que existe un instrumento jurídico que implica un traspaso de recursos MRR (independientemente de su clase) de una entidad pública a otra entidad pública, deberá registrarse dicho instrumento jurídico como una actuación y marcar en ésta el campo de “Transfiere dinero a otro subproyecto del Plan” dentro de dicha actuación, creando, en consecuencia, el respectivo subproyecto.



ESQUEMA ORIENTATIVO DE ACTUACIONES A INCORPORAR EN S-SI DEPENDIENTES DE LA AEI

- Una actuación NO necesariamente = un instrumento jurídico. Conveniente agregar IJ en una única actuación considerando los criterios previos.
- Importante considerar el volumen de los diferentes gastos/expedientes: ¿Es posible sistematizar/ ordenar las actuaciones de una determinada manera?
- ¿Qué datos, documentos se ha de incorporar a CoFFEE? (Importante Orden HFP/55/2023)

Contratos menores

Contratos de personal



ESQUEMA ORIENTATIVO DE ACTUACIONES A INCORPORAR EN S-SI DEPENDIENTES DE LA AEI II

- A. *Actuación tipo “Contrato”: Contratos*
- B. *Actuación tipo “Contrato”: Contratos menores*
- C. *Actuación tipo “Otros-A Especificar”: Contratos de personal*
- D. *Actuación tipo “Otros- A Especificar”: Otros gastos (NO Minerva)*

Mi entidad participa en varias líneas de subvenciones dentro de una misma medida. Por ejemplo, C17.I03 o C17.I02, de tal manera que mi entidad recibe varias vías de financiación o líneas de subvenciones (i.e. C17.I03, mi entidad participa en PDC; CPP y TED).

En el caso de la medida C17.I04, la arquitectura podría ser sustancialmente diferente.



ESQUEMA ORIENTATIVO DE ACTUACIONES A INCORPORAR EN S-SI DEPENDIENTES DE LA AEI

Mi entidad participa en varias líneas de subvenciones dentro de una misma medida. Por ejemplo, C17.I03 o C17.I02, de tal manera que mi entidad recibe varias vías de financiación o líneas de subvenciones (i.e. C17.I03, mi entidad participa en PDC; CPP y TED).

Un esquema que integre el esquema previo y orden para el centro gestor, equilibrando concentración de las Actuaciones e IJ y orden en CoFFEE podría constituir:

Actuación tipo contrato "Contratos" -PDC

Actuación tipo contrato (Contratos menores) - PDC

Actuación tipo Otros a Especificar (Contratos de Personal) – PDC

Actuación tipo Otros a Especificar (Otros Gastos)- PDC

Actuación tipo contrato "Contratos" –CPP

Actuación tipo contrato (Contratos menores) –CPP

Actuación tipo Otros a Especificar (Contratos de Personal) –CPP

Actuación tipo Otros a Especificar (Otros Gastos) – CPP

Actuación tipo contrato "Contratos" –TED

Actuación tipo contrato (Contratos menores) –TED

Actuación tipo Otros a Especificar (Contratos de Personal) –TED

Actuación tipo Otros a Especificar (Otros Gastos) – TED



FASE DE PLANIFICACIÓN - FAQs

FAQs fase de planificación

Creación de actuaciones



PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES I

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

CoFFEE | Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

PREPRODUCCION

KG000636

> Planificación y gestión > Actuaciones

Actuaciones

Buscar en la tabla

Nueva actuación

Localizador	Código provisional	Denominación	Nodo padre revisado	Entidad Ejecutora	Órgano Gestor	Estado	Clase de Actuación
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
		Convocatorias de ayudas a municipios para la					



Alta actuación

✕ Cancelar

✓ Guardar

La actuación que se va a crear pertenece a un ☐ Proyecto o a un ☒ Subproyecto o a un ☐ Subproyecto en estado previo a 'Revisado'

Subproyecto *

C17.I02.P01.S02 - CONVOCATORIAS AEI: EIN, EUR, ECT, EQC - Universidad Pablo de Olavide - Q9150016E



Clase de actuación *

Contrato



Nombre de la actuación *

Contratos UPO | PDC

Descripción *

Contratos de los proyectos de investigación financiados por MRR en el marco de las convocatorias de PDC

Descripción corta



Descripción *

Contratos de los proyectos de investigación financiados por MRR en el marco de las convocatorias de PDC

Descripción corta

Observaciones

Fecha inicio *

1T/2023



Fecha fin *

4T/2026



Anualidad de planificación

2023

Estado *

Borrador

Pantalla una vez se ha creado la actuación:

Contratos UPO- PDC

[Borrar](#)[Cancelar](#)[Guardar](#)

Subproyecto *

C17.I02.P01.S02 - CONVOCATORIAS AEI: EIN, EUR, ECT, EQC - Universidad Pablo de Olavide - Q9150016E

Localizador	Código provisional *	Fecha inicio *	Fecha fin *	Anualidad de planificación	Estado *
	C17.I02.P01.S02.PROVISIC	1T/2023	4T/2026	2023	Borrador

Clase de actuación *

Contrato

La actuación implica una transferencia de recursos económicos a otro Subproyecto del Plan *

No

Nombre de la actuación *

Contratos UPO- PDC

Descripción *

Contratos de los proyectos de investigación financiados por MRR en el marco de las convocatorias de PDC



[Volver a Actuaciones](#)

[Contratos UPO- PDC...](#)

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climáticos y digitales

Recursos económicos

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos

Árbol de estructura

[Planificación y gestión](#) > [Actuaciones](#) > [Datos generales](#)

Contratos UPO- PDC

[Borrar](#)

[Cancelar](#)

[Guardar](#)

Subproyecto *

C17.I02.P01.S02 - CONVOCATORIAS AEI: EIN, EUR, ECT, EQC - Universidad Pablo de Olavide - Q9150016E

Localizador

Código provisional *

Fecha inicio *

Fecha fin *

Anualidad de planificación

Estado *

C17.I02.P01.S02.PROVISIC

1T/2023



4T/2026



2023

Borrador

Clase de actuación *

Contrato

La actuación implica una transferencia de recursos económicos a otro Subproyecto del Plan *

No

Nombre de la actuación *

Contratos UPO- PDC

¿QUÉ CUMPLIMENTAR EN CADA UNO DE LOS CAMPOS?

En recursos económicos:

La planificación de costes de los recursos a utilizar en mi actuación, en coherencia con el ciclo de vida de la actuación (y del subproyecto en el que la actuación se enmarca).

En H/O gestión críticos; no críticos; Hitos Auxiliares:

Si mi actuación entra dentro de la medida **C17.I02**: Seleccionaré el Objetivo 260 (únicamente el 260). Solo deberán figurar a nivel S/SI y actuación dependiente el Objetivo de gestión crítico 260.

Si mi actuación entra dentro de la medida **C17.I03**: Seleccionaré el Hito Auxiliar de Definición que por defecto heredo del S/SI del que depende la actuación

Si mi actuación entra dentro de la medida **C17.I04**: Seleccionaré el Objetivo 264 (únicamente el 264). Solo deberán figurar a nivel S/SI y actuación dependiente el Objetivo de gestión crítico 264.



[Volver a Actuaciones](#)

[Contratos UPO- PDC...](#)

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climáticos y digitales

Recursos económicos

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos

Árbol de estructura

[Planificación y gestión](#) > [Actuaciones](#) > [Hitos/Objetivos de gestión críticos](#)



Hitos y objetivos críticos

Buscar en la tabla

**Nuevo H/O
gestión crítico**



Localizador 1

Denominación 2

Tipo

No existen registros

Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>



[Volver a Actuaciones](#)

Contratos UPO- PDC...

Datos generales

|

C17.I02.P01.S02.OBC01 - 260 - Finalización de todos los proyectos de mejora de las infraestructuras científicas y de la capacidad del Sistema español de Tecnología e Innovación Científica, incluidos los proyectos sobre infraestructuras europeas e internacion

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos

Árbol de estructura

[Planificación y gestión](#) > [Actuaciones](#) > [Hitos/Objetivos de gestión críticos](#) > [Alta h/o crítico](#)



Hitos y objetivos críticos

[Cancelar](#)

[Guardar](#)

Hito/Objetivo del proyecto *

Seleccione un hito/objetivo del proyecto

Descripción del Hito/Objetivo *

Observaciones

Mecanismo de verificación *



Hitos y objetivos críticos

✕ Cancelar

✓ Guardar

Hito/Objetivo del proyecto *

C17.I02.P01.S02.OBC01 - 260 - Finalización de todos los proyectos de mejora de las infraestructuras científicas y de la capacidad del Sistema español de Tecnología e Innovación Científica, inclui... ✕ ⊖

Nombre *

260 - Finalización de todos los proyectos de mejora de las infraestructuras científicas y de la capacidad del Sistema español

Tipo *

Objetivo

Fecha cumplimiento planificada *

Sin fecha ⊖

Descripción del Hito/Objetivo *

Finalización del 100 % de los proyectos de I + D (con un presupuesto total de 439 000 000 EUR) en consonancia con el objetivo de fortalecer las infraestructuras científicas y la capacidad del Sistema español de Tecnología e Innovación Científica mediante la renovación del equipamiento científico, la modernización de la instalación BSL3, la creación de una nueva infraestructura fitogénica, el

Observaciones

Mecanismo de verificación *

Documento de síntesis que justifique debidamente cómo se ha cumplido el objetivo (incluyendo los elementos relevantes del mismo, tal y como se enumeran en la descripción del objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID).

Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con la lista de proyectos adjudicados, una lista de los proyectos de apoyo a las infraestructuras europeas e internacionales y una lista de los proyectos ejecutados mediante inversión pública directa. Para cada uno de ellos: a) nombre del proyecto e identificador único (número o código), b) el presupuesto total del proyecto (sin IVA), y c) para las adjudicaciones, una lista de la publicación de las mismas en el BOE o en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de España y los enlaces correspondientes al BOE o a la Base de Datos



Indicadores

Buscar en la tabla

Localizador  1	Tipo 	Denominación  2	Valor base 	Valor objetivo 	Unidad de medida 	Acciones
IND001260	Cuantitativo	Finalización de todos los proyectos de mejora de las infraestructuras científicas y de la capacidad del Sistema español de Tecnología e Innovación Científica, incluidos los proyectos sobre infraestructuras europeas e internacionales	0,000	0,202	%	
IND001260a	Cuantitativo	Presupuesto ejecutado en proyectos de I + D	0,00000000	0,88700000	Millones EUR	
IND001260b	Cuantitativo	Presupuesto total a ejecutar	439,00000000	439,00000000	Millones EUR	

Mostrando de 1 a 3 de 3 resultados << < 1 > >>



Editar indicador

Escribe el valor base *

0,00000000

Escribe el valor objetivo *

0,30000000

Unidad de medida

Millones EUR

✕ Cancelar


✓ Guardar



ÍNDICE

1. Marco introductorio y conceptos generales
2. Metodología del PRTR
- 3. Fases**
 1. Definición
 2. Planificación
 - 3. Ejecución (Seguimiento y Control)**
 4. Acreditación

CICLO DE VIDA DEL SUBPROYECTO

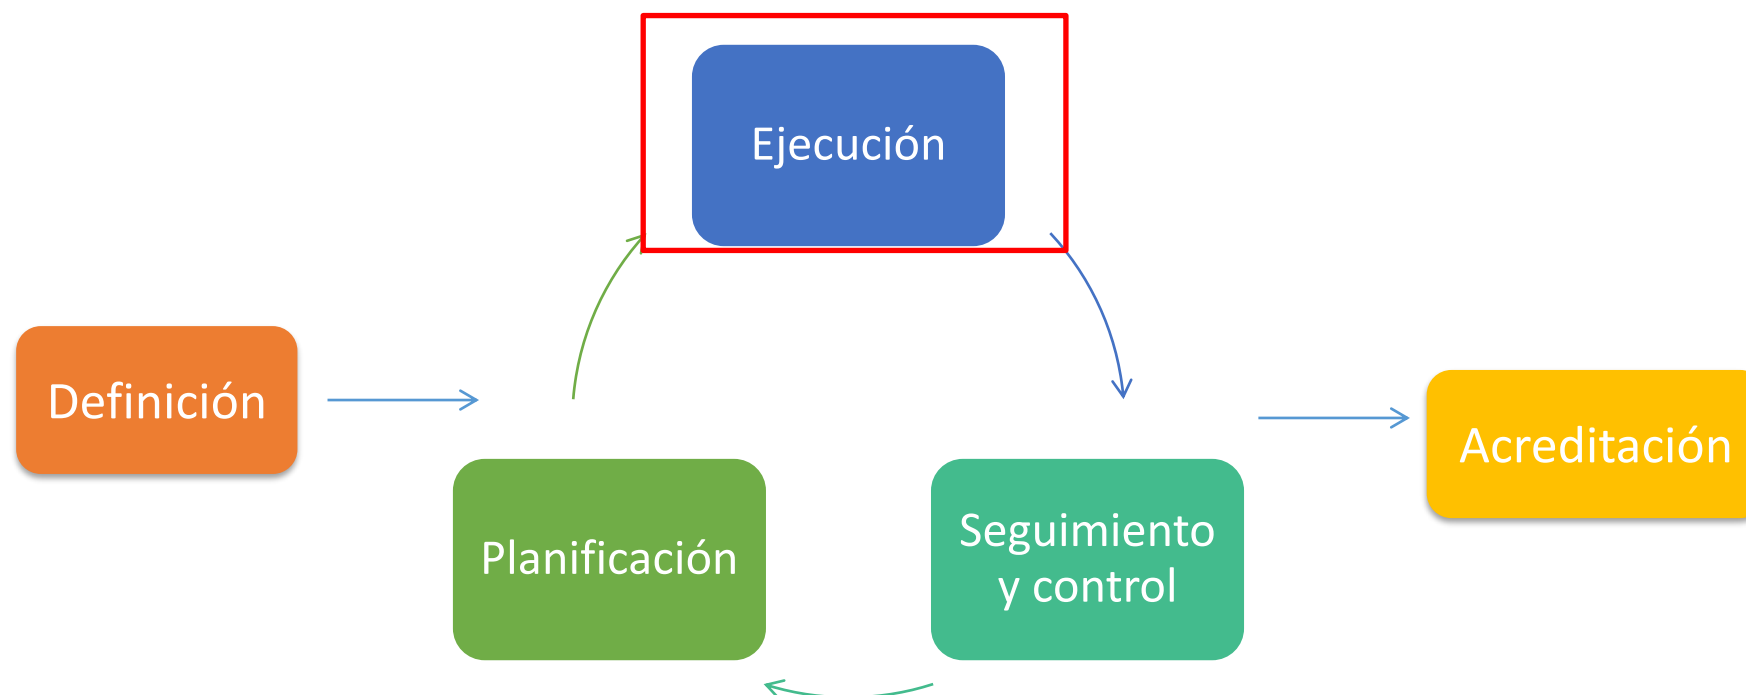

Se aplica en todos los niveles del Plan de forma jerárquica



FASE DE EJECUCIÓN

El objetivo de esta fase es que los Hitos y Objetivos del SP, lleguen al estado "Cumplido"

1. Registrar Instrumentos Jurídicos - Datos Generales

2. Registrar Instrumentos Jurídicos - Perceptores

3. Creación de SP/SPI hijos **SI PROCEDIESE**

4. Reportar Progreso en las actuaciones y añadir Mecanismos de verificación.

5. Agregación y del reporte y de los mecanismos de verificación.



[Volver a Actuaciones](#)

Contratos UPO- PDC...

Datos generales

Submedidas asociadas

Objetivos climáticos y digitales

Recursos económicos

Hitos/Objetivos de gestión críticos

Hitos/Objetivos de gestión no críticos

Hitos auxiliares

Progreso de indicadores

Contratos asociados

Documentos anexos

Árbol de estructura

[Planificación y gestión](#) > [Actuaciones](#) > [Contratos asociados](#)

?

Buscar en la tabla

Nuevo contrato

Código órgano	Código licitación	Código contrato	Código operación	Denominación	Tipo de contrato	Fecha formalización	Importe sin IVA	Importe total	Acciones
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	
Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >> 10									

05/07/2023

GOBIERNO DE ESPAÑA

AGENDA 2030

ESPAÑA PUEDE.

CoFFEE-MRR



Contrato PLACSP



Sí



Completar

Código órgano

Código licitación

Código contrato *

¿La fecha de publicación del contrato es posterior a la publicación de la OM HFP/55/2023, de 24 de enero? *

Seleccione si es posterior



Código Operación

Denominación *

Tipo contrato *

Seleccione el tipo de contrato



Aplicación presupuestaria

Fecha formalización



Importe sin IVA

Importe total



Actualización contrato

[X Cancelar](#)[✓ Guardar](#)

Contrato PLACSP

☐ Sí

Código contrato *

12345678

¿La fecha de publicación del contrato es posterior a la publicación de la OM HFP/55/2023, de 24 de enero? *

Si



Código Operación

MRR\$8dtnxjpk7zu5L9Zw

Denominación *

Contrato para la adquisición de material de laboratorid

Tipo contrato *

Suministros



Aplicación presupuestaria

Fecha formalización



Importe sin IVA

100.000,00 €

Importe total

121.000,00 €

Observaciones

URI de la licitación



Solicitudes de responsable de operación

Buscar en la tabla

Nueva solicitud de responsable de operación


Usuario solicitante ↑↓ Usuario a perfilar ↑↓ Cargo ↑↓ Perfil solicitado ↑↓ Fecha solicitud ↓ 2 Estado solicitud ↑↓

No existen registros

Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>

Contratistas

Buscar en la tabla



+ Nuevo contratista/subcontratista

NIF ↑↓ ∨ Nombre/Razón social ↑↓ ∨ Rol ↑↓ ∨ Lote ↑↓ ∨ Importe sin IVA ↑↓ ∨ Importe total ↑↓ ∨ Acciones

Mostrando de 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >> 10 ⊖

*N/A: No Aplica.



FASE DE EJECUCIÓN

El objetivo de esta fase es que los Hitos y Objetivos del SP, lleguen al estado "Cumplido"

1. Registrar Instrumentos Jurídicos - Datos Generales

2. Registrar Instrumentos Jurídicos - Perceptores

3. Creación de SP/SPI hijos **SI PROCEDIESE**

4. Reportar Progreso en las actuaciones y añadir Mecanismos de verificación.

5. Agregación y del reporte y de los mecanismos de verificación.

